

# Тестовое задание

Продукт: ИИ помощник управляющего  
Роль: BA+Project Management  
Автор: cthulhuу

# Вопросы к заказчику и стейкхолдерам

**Вопрос 1:** Какие источники данных сейчас используются (остатки, движения, закупки, цены, сроки годности, загрузка) и в каком виде они доступны для пилота — выгрузки, ABS, Excel?

**Кому:** Управляющий, администратор склада, ИТ ABS

**Зачем:** Зафиксировать состав и формат входных данных для синтетического датасета и модели

**Какой риск закрываем:** Риск строить расчёты на неполных/несопоставимых данных

**Вопрос 2:** Как сейчас считают потребность и объём заказа: средний расход за какой период, страховой запас в днях, учитывают ли открытые заказы и плановую загрузку?

**Кому:** Управляющий, специалист по закупкам, администратор склада

**Зачем:** Опереть формулы MVP на принятую практику Mountain & Sea Spa

**Какой риск закрываем:** Риск «красивых», но чужих для бизнеса цифр и провала на демо

# Вопросы к заказчику и стейкхолдерам

**Вопрос 3:** Какие правила критичны для склада: FEFO, порог «приближается срок годности», когда партия списывается, а не расходуется?

**Кому:** Администратор склада, управляющий

**Зачем:** Заложить единые правила алертов и списания в расчётный модуль

**Какой риск закрываем:** Риск расхождения с реальной складской логикой и ложных рекомендаций

**Вопрос 4:** Есть ли утверждённые лимиты бюджета (месяц / квартал / полугодие / год) по объекту и категории, и кто их задаёт?

**Кому:** Управляющий

**Зачем:** Определить вход `budget_limit` и сценарий сравнения плана с лимитом

**Какой риск закрываем:** Риск плана без управленческого смысла «влезли / не влезли»

# Вопросы к заказчику и стейкхолдерам

**Вопрос 5:** Как сегодня вручную считаете остатки и потребность: по какой формуле, за какой период, учитываете ли открытые заказы и плановую загрузку? Есть ли утверждённый регламент/инструкция (пришлите, если есть)?

**Кому:** Управляющий, администратор склада

**Зачем:** Зафиксировать методологию AS IS — воспроизвести её в MVP, а не выдумать свою

**Какой риск закрываем:** Риск формулы, с которой бизнес не согласен на демо

**Вопрос 6:** Опыт сотрудников (чутьё на сезон, ненадёжных поставщиков, «заказать раньше срока») — где он живёт и как передаётся? Можно ли уже сейчас оцифровать его в 3–5 детерминированных правил?

**Кому:** Специалист по закупкам, управляющий

**Зачем:** Оцифровать неявные правила → вход для расчётного модуля

**Какой риск закрываем:** Риск «красивых», но чужих для бизнеса цифр

# Вопросы к заказчику и стейкхолдерам

**Вопрос 7:** Как MVP должен стыковаться с ABS: отдельный прототип, iframe/модуль, только API-контракт на будущее?

**Кому:** ИТ ABS, заказчик

**Зачем:** Выбрать архитектуру поставки без лишних интеграций

**Какой риск закрываем:** Риск уйти в интеграцию вместо демонстрационного MVP

**Вопрос 8:** Где лежит история закупок (последние 2–3 заказа по каждой позиции: дата, поставщик, цена, срок поставки)?  
Можно ли получить выгрузку/скрин до вехи 2?

**Кому:** ИТ ABS

**Зачем:** Понять источник данных для синтетического датасета


**Какой риск закрываем:** Риск синтетики, не похожей на реальность

# Описание бизнес процесса

Для описания бизнес процесса я выбрала диаграмму последовательности и бизнес процесс: Формирование плана закупок и бюджета на квартал

Диаграмму последовательности UML можно посмотреть по ссылке

<https://github.com/TheDataTrickster/project-510-ecom/blob/main/uml.svg>

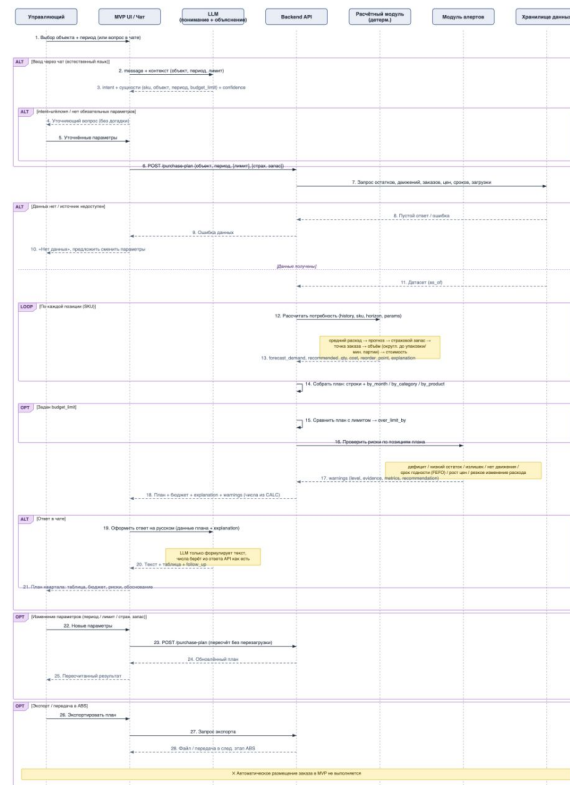

# Дорожная карта пилота (2 месяца)

| Веха                                            | Срок       | Что должно быть готово                                                                                                                                            | Кто вовлечен                                       |
|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>1. Kick-off и фиксация score</b>             | Неделя 1   | Есть ответы на ключевые вопросы; утверждён MVP vs out-of-score; согласован эталонный демо-кейс; черновик 20 контрольных вопросов                                  | Заказчик, BA/PM, управляющий, команда              |
| <b>2. Модель данных и синтетический датасет</b> | Недели 1–2 | Описание сущностей и связей; датасет покрывает дефицит / излишек / срок / нет движения / рост цены / поставка в пути; правила FEFO и пороги алертов зафиксированы | BA, DS, Backend, управляющий, администратор склада |
| <b>3. Расчётный контур + API</b>                | Недели 2–4 | Работают остаток из движений, forecast, alerts, plan/budget; расчёты отделены от LLM; базовые тесты на FEFO, точку заказа, округление до партии                   | Backend, DS, BA (приёмка формул), заказчик         |
| <b>4. UI управляющего + чат</b>                 | Недели 3–6 | Дашборд, остатки, алерты, расчёт закупки, план/бюджет, чат на русском; смена объекта/периода/лимита пересчитывает результат                                       | Frontend, Backend, DS, BA                          |

# Дорожная карта пилота (2 месяца)

| Веха                                           | Срок       | Что должно быть готово                                                                                                              | Кто вовлечен                       |
|------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5. Контрольные сценарии и отладка</b>       | Неделя 6–7 | ≥15/20 контрольных вопросов — корректны; сквозное демо: склад → прогноз → риск → план → бюджет; время ответа в норме инфраструктуры | Вся команда, управляющий, заказчик |
| <b>6. Демо заказчику и фиксация next steps</b> | Неделя 8   | Демо проведено; список ограничений и план развития согласованы; переданы код, инструкция, описание данных                           | Заказчик, BA/PM, команда           |

# Работа с заказчиком и командой разработки

Планирую работать с командой по SCRUM – спринт 2 недели, демо Заказчику 1 раз в неделю.

Задачи будут заведены и описаны в таск-трекере (Заказчика или собственном при необходимости).

Для меня важны принципы работы – поддерживать прозрачность процессов для Заказчика, полноту информации для команды.

Держу команду и заказчика в одном информационном поле: ранний сигнал – причина задачи – решение без обесценивания, ретро для формирования команды, а не только по статусам.

# Работа с заказчиком и командой разработки

| Кто участвует      | Формат                        | Частота                                | Фокус                                                                                            |
|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Заказчик + команда | Демо инкремента               | 1 раз в неделю                         | Показ готового; решения по приоритетам; ответы на открытые вопросы; приёмка                      |
| Заказчик + PM/BA   | Короткий статус / ad-hoc      | По блокерам                            | Разблокировка без ожидания следующего демо                                                       |
| Команда            | Daily standup                 | Ежедневно 15 мин                       | Кратко: что сделано за предыдущий день, что планируется на текущий день. Блокеры (при появлении) |
| Команда            | Backlog Grooming (Refinement) | 1 раз в спринт (середина спринта)      | Уточнение и оценка задач следующего спринта, готовность к планированию                           |
| Команда            | Sprint Planning               | Раз в 2 недели (перед стартом спринта) | Цели спринта, score, критерии готовности                                                         |
| Команда            | Sprint Review (внутренняя)    | Раз в 2 недели (конец спринта)         | Сверка результата спринта, подготовка к демо с заказчиком                                        |
| Команда            | Ретроспектива                 | Раз в 2 недели (конец спринта)         | Что улучшить в процессе, договорённости на следующий спринт                                      |

# Мотивация участия в проекте

**Вопрос:** Почему тебе интересен этот проект?

**Ответ:** Профессиональный интерес. Хочется продолжить свой опыт в еcom и сделать кейс с внедрением AI, который принес коммерческий результат.

**Вопрос:** Как ты видишь свою роль в команде, которая создаёт продукт?

**Ответ:** менеджер, который доведет проект до результата и найдет способ привнести дополнительную ценность в продукт за счет раскрытия потенциала команды.

**Вопрос:** Сколько времени в неделю ты готов(а) уделять проекту и в течение какого периода?

**Ответ:** 20 - 40 часов в неделю.
